



Financiering Breedband



➤ Financiering Breedband

- beslispunten gemeenteraad 29 september 2016
- subsidie beschikking
- uitvoeringsovereenkomst

➤ Update project Coöperatie Sterk Midden-Drenthe U.A.

- project in data
- project in cijfers
- project uitdagingen
- project in nieuwe fase

O	Financiëring Breedband	
	Portefeuillehouder	Wethouder Bent
	Besluit Gemeenteraad	De raad besluit: 1. Een lening te verstrekken van maximaal € 2.750.000,00 aan de coöperatie Sterk Midden Drenthe, ten behoeve van de aanleg en het beheer van een breedbandnetwerk in de gemeente Midden-Drenthe en daarmee af te wijken van artikel 10 van de financiële verordening Midden Drenthe 2015. 2. De lening te verstrekken onder de volgende condities: a) Een looptijd van maximaal 22 jaar. b) Een marktconform rentepercentage, vastgesteld door Europa op 4% bovenop baserate NL. c) Indien de aanbesteding leidt tot een lager bedrag de verstrekking van de lening op dit lagere bedrag vast te stellen. d) Indien de aanbesteding leidt tot een hoger bedrag de raad opnieuw hierover te consulteren. 3. De juridische en financiële risico's op de lening te verminderen door: a) Een recht van hypotheek te vestigen op het netwerk. b) Bij vervreemding van het netwerk aan derden mee te delen in de eventuele winst. c) De lening te verstrekken onder het regime van de subsidieverordening, met gelijke voorwaarden als de provincie Drenthe en met bepalingen inzake tussentijdse informatieverstrekking over financiële en inhoudelijke resultaten. d) Besluiten van de coöperatie inzake vervreemding van het netwerk en het doen van uitkeringen aan deelnemers of derden voorafgaande ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeente als kredietgever e) In de leningovereenkomst te bepalen dat in de Raad van Commissarissen van de coöperatie twee commissarissen zitting hebben die op voordracht van de gemeente worden benoemd, waarvan één commissaris zo spoedig mogelijk wordt voorgedragen en waarvan één commissaris wordt voorgedragen op het moment dat conform het rooster van aftreden een zittende commissaris aftreedt. f) In de leningovereenkomst te bepalen dat de kredietnemer alleen langlopende verbintenissen zal afsluiten die passen binnen de business-case en dat bij besluiten over majeure contractuele verplichtingen die de terugbetalingscapaciteit van de coöperatie kunnen aantasten de gemeente voorafgaand aan de besluitvorming geconsulteerd zal worden. g) In de leningovereenkomst te bepalen dat liquide middelen die niet nodig zijn voor de continuïteit van de coöperatie volledig benut zullen worden voor het vervroegd aflossen van de leningen. h) In de leningovereenkomst te bepalen de coöperatie geen activiteiten zal ontplooiën of verplichtingen zal aangaan die buiten de doelstellingen van de business-case vallen, zonder overleg en de schriftelijke instemming van de kredietgever. 4. De activiteiten inzake het aanleggen en beheer van breedband aan te wijzen als activiteiten die plaatsvinden in het algemeen belang, als bedoeld in artikel 25h, 5e lid van de Mededingingswet. 5. Een risicoreserve Breedband te vormen. a) De hoogte van de risicoreserve gelijk te stellen met het uitstaande bedrag van de lening van maximaal € 2.750.000,00. Bij aflossing kan jaarlijks een bedrag vrijvallen. b) Het bedrag van €2.750.000,00 te onttrekken aan de reserve Openbare Ruimte. 6. De geheimhouding op bijlage 1 (Second Opinion Business Case) 2 (Beschrijving Business Case), 5 (Concept Leningovereenkomst) ,7 (Juridisch advies Pro Facto), 8 (Concept Subsidiebeschikking) en 10 (Juridisch advies Nysingh) van het raadsvoorstel, zoals beschreven in de toelichting te bekrachtigen op grond van artikel 25 lid 3 van de Gemeentewet en artikel 10 lid 1 sub c en lid 2 sub g van de Wet Openbaarheid Bestuur.

Relatie tussen financiers (Provincie & Gemeente)

Subsidie beschikking

- Voorwaarden
- Bevoorschotting
- Vaststelling

Uitvoeringsovereenkomst

Update project

Coöperatie Sterk Midden- Drenthe U.A.

Project in data



- 2012 start burgerinitiatief
- 2013-2014 gemeentelijke werkgroep
- Mei 2014 oprichting stichting Marktverkenning Sterk Midden-Drenthe
- 16 Maart 2015 start vraagbundeling 1.0
- 18 December 2015 ca. 65% deelname via harde contracten met Plinq er
- Januari 2016 marktconsultatie
- April 2016 start aanbesteding
- 31 mei 2016 oprichting Coöperatie Sterk Midden-Drenthe u.a.
- 7 Juli 2016 start Europese aanbesteding
- 30 september 2016 tekening leningsovereenkomsten met provincie en gemeente
- Oktober 2016 gunning aan BAM
- 21 december 2016 tekening order aan BAM
- Februari 2017: providers Netvisit en Plinq haken af.
- 8 maart 2017 start civiele werkzaamheden BAM, in Noorderveld in januari 2017.
- Maart 2017 start vraagbundeling 2.0 met Stipte, Fiber en TriNed
- Geheel 2018: POP's plaatsen en aansluiten, graven, huisaansluitingen en activatie van klanten.
- 7 oktober 2018 werkzaamheden BAM gereed
- Nu in B&O fase

2012

2018

Project in cijfers CSMD

- Midden-Drenthe 345 km²
- 23 dorpen en kernen
- 550 km geul graven
- 120 km door tuintjes graven
- 2.000 km glasvezel aanleggen
- Van 5.530 naar 5.869 aansluitadressen
- Investering CSMD van >12<13 miljoen euro
- Ca. 100 man aan het werk gehad
- tot 1.000 Mbs up en down
- Oktober 2606, december 2.750 actieve aansluitingen



Gebied met een initiatief
 Vraaginventarisatie/bundeling
 Aanleg
 Aangesloten

Ligging initiatieven breedband

-  Geografie Initiatief nog niet bekend
 Code Initiatief
 Gemeentegrens
 Gress Cluster
 Gress Initiatief


- [illegible]

Project in uitdagingen

- 8 maart 2017 start civiele werkzaamheden BAM
 - Gedwongen provider switch: start vraagbundeling 2.0 in maart 2017
 - Volgorde bouwen POP gebieden veranderd
 - Verplaatsen POP Wijster
 - Gedwongen gezamenlijke geul gebruik Enexis/WMD Beilervaat
 - Te weinig ploegen vanaf zomer 2017
 - Daardoor 3 weken vorst in 2018
- (te laat) gereed op 7 oktober 2018 (10 maanden later dan oorspronkelijk gepland)
- Claim naar BAM
- Oplevering nu bezig.
- Gevolgen:
 - In vraagbundeling 2 minder abonnementen dan in vraagbundeling 1
 - Cash flow komt later op gang

Project in nieuwe fase

- Bouw is gereed
- Nu in Beheer & Onderhouds fase
- Organisatie aangepast aan nieuwe werkelijkheid
- Doelen korte termijn:
 - Netwerk stabiliteit
 - Klanttevredenheid
 - Leden groei
 - Eind 2018 2.750
 - Eind 2019 3.200
 - Eind 2020 3.400

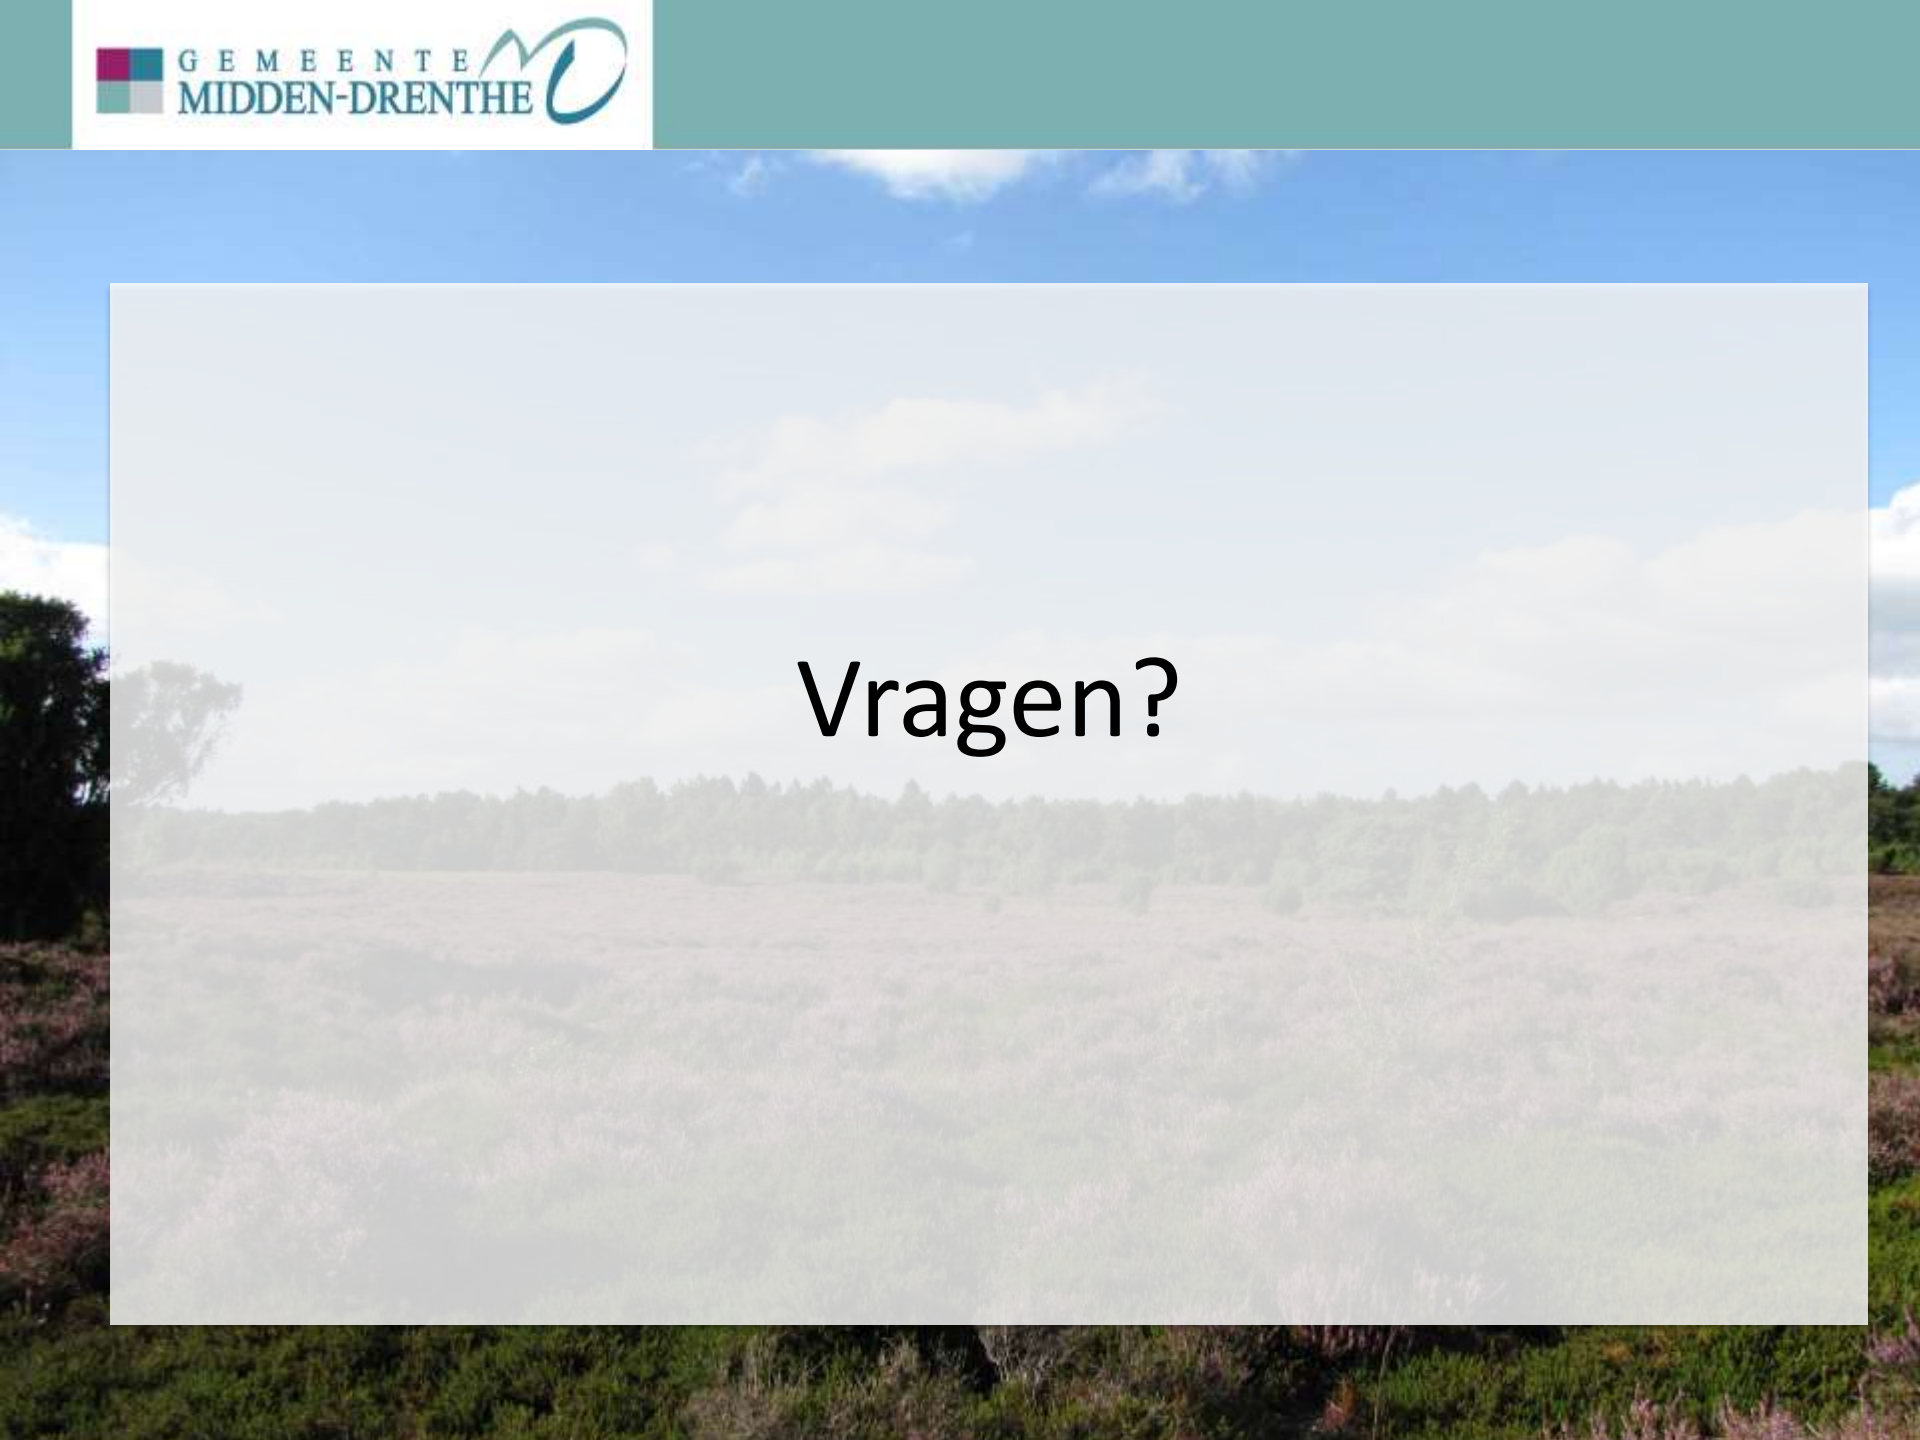

Vragen?
