Planning nieuwbouw VO + visie De Haven

		start	eind
1. Kadernotitie VO	**Raadsbesluit**	**Jul-16**	**Dec-16**
Opstellen en vaststellen door gemeenteraad			
2. Aanbesteding projectbegeleider VO		**Nov-16**	**Mar-16**
2.1 Beschrijvend document opstellen		1/12/16	15/12/16
2.2 Projectbegeleiders selecteren en uitnodigen voor offerte		9/12/16	16/12/16
2.3 Eerste vragenronde + beantwoorden		12/01/17	19/01/17
2.4 Tweede vragenronde + beantwoorden		26/01/17	2/02/17
2.5 Ontvangst offertes			9/02/17
2.6 Interviews deelnemers			16/02/17
2.7 Beoordeling		17/02/17	28/02/17
2.8 Gunning opdracht	**Collegebesluit**	29-02-17	7/03/17
3. Plan van eisen opstellen (3,5 mnd) VO		**Mar-17**	**Jun-17**
4. Financiële uitgangspunten (1 mnd) VO			**Jul-17**
5. Plan van eisen vaststellen (1 mnd) VO	**Collegebesluit**		**Jul-17**
6. Krediet bouw school	**Raadsbesluit**	**Jul-17**	**Sep-17**
7. Selectie adviseurs (architect, constructeur, installatie) (5 mnd) VO	**Collegebesluit**	**May-17**	**Nov-17**
8. Ontwerpfase (10 mnd) VO	**Collegebesluit**	**Oct-17**	**Sep-18**
Van voorlopig tot definitief ontwerp Inclusief omgevingsvergunning			
9. Aanbesteding (5 mnd) VO	**Collegebesluit**	**Jun-18**	**Nov-18**
Voorselectie, aanbesteding + gunning			
10. Realisatie (15 mnd) VO		**Nov-18**	**Mar-20**
Van uitvoering tot oplevering, incl werkvoorbereiding			
11. Opstellen gebiedsvisie De Haven		**Dec-16**	**Jul-17**
3.1 Inventarisatie		Dec-16	Feb-17
3.2 Opstellen concept-visie met secenario's		Feb-17	Mar-17
3.3 Vaststellen concept-visie door b en w	**Collegebesluit**		Apr-17
3.4 Inspraak op concept-visie			May-17
3.5 Verwerken inspraak		May-17	Jun-17
3.6 Vaststellen visie door b en w	**Collegebesluit**		Jun-17
3.7 Vaststellen visie door gemeenteraad	**Raadsbesluit**		Jul-17
12. Bestemmingsplanprocedure VO	**Raadsbesluit**	**Jun-17**	**Sep-18**

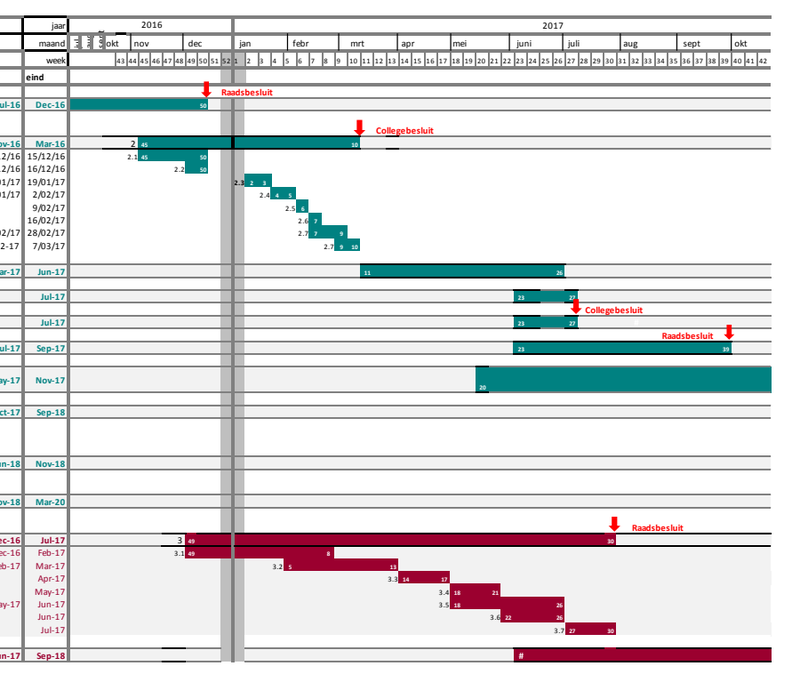

Planning **nieuwbouw VO** + **visie De Haven**

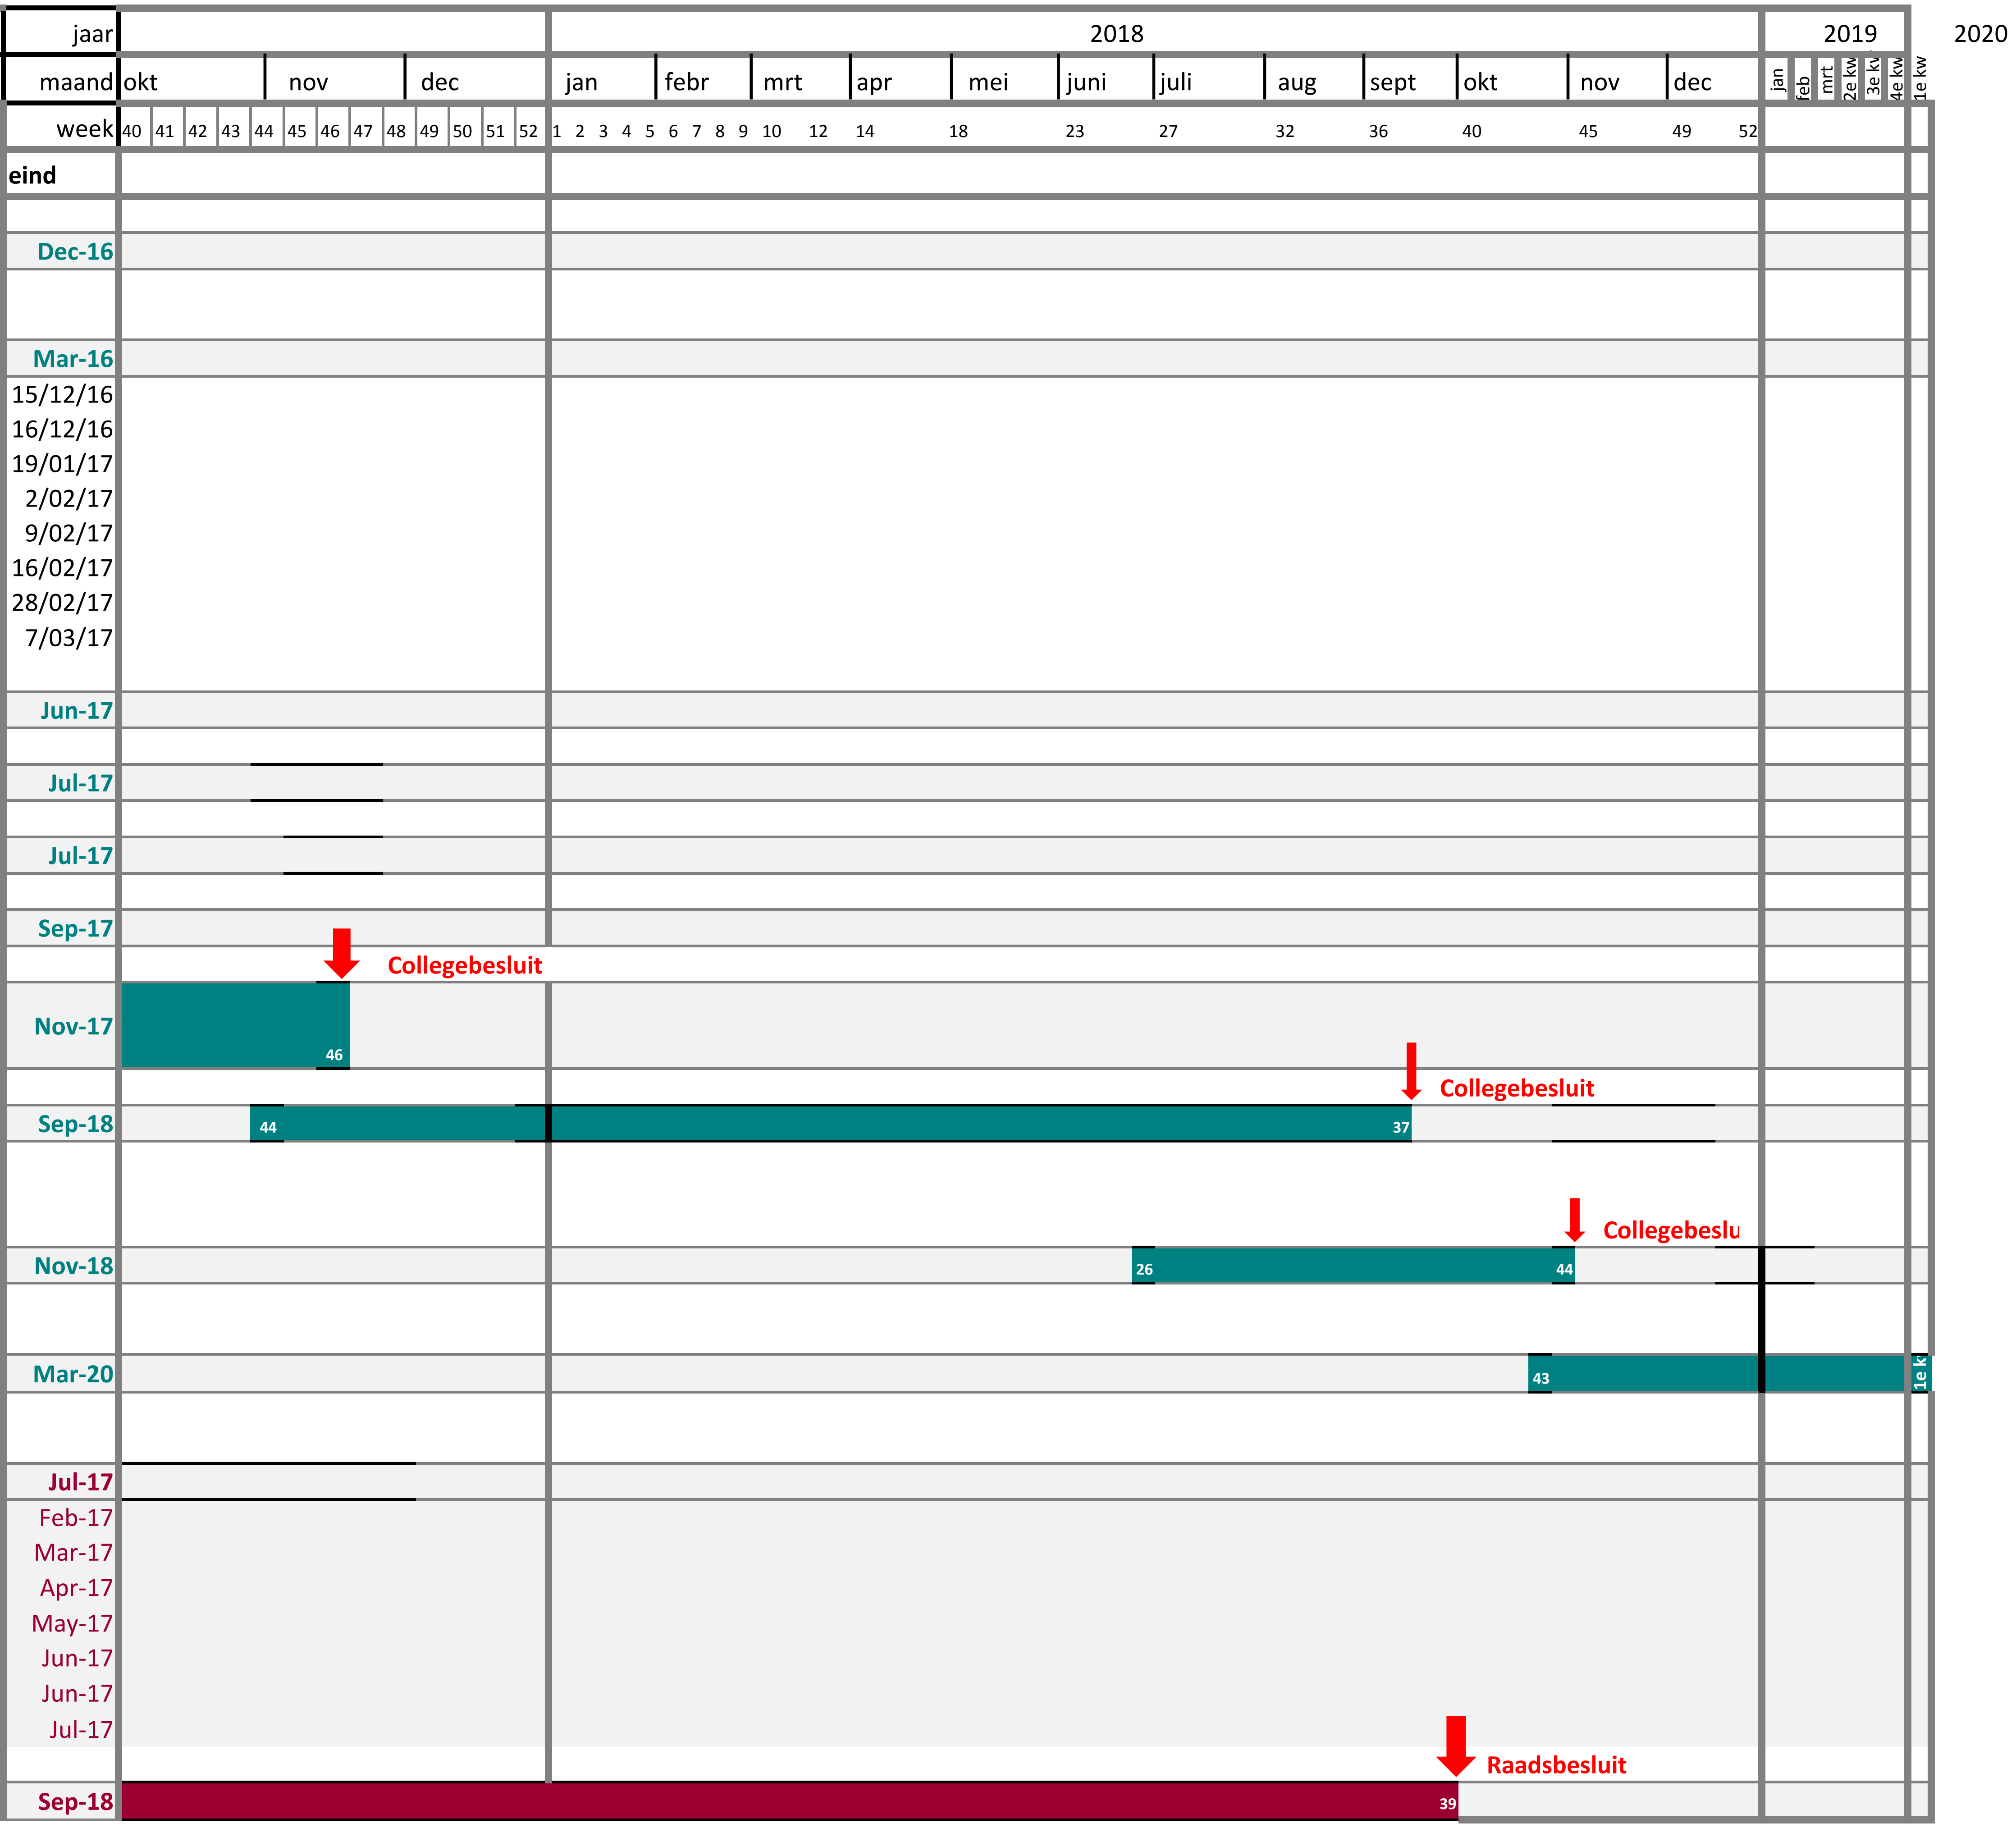		start	eind
1. Kadernotitie VO	**Raadsbesluit**	**Jul-16**	**Dec-16**
Opstellen en vaststellen door gemeenteraad			
2. Aanbesteding projectbegeleider VO		**Nov-16**	**Mar-16**
2.1 Beschrijvend document opstellen		1/12/16	15/12/16
2.2 Projectbegeleiders selecteren en uitnodigen voor offerte		9/12/16	16/12/16
2.3 Eerste vragenronde + beantwoorden		12/01/17	19/01/17
2.4 Tweede vragenronde + beantwoorden		26/01/17	2/02/17
2.5 Ontvangst offertes			9/02/17
2.6 Interviews deelnemers			16/02/17
2.7 Beoordeling		17/02/17	28/02/17
2.8 Gunning opdracht	**Collegebesluit**	29-02-17	7/03/17
3. Plan van eisen opstellen (3,5 mnd) VO		**Mar-17**	**Jun-17**
4. Financiële uitgangspunten (1 mnd) VO			**Jul-17**
5. Plan van eisen vaststellen (1 mnd) VO	**Collegebesluit**		**Jul-17**
6. Krediet bouw school	**Raadsbesluit**	**Jul-17**	**Sep-17**
7. Selectie adviseurs (architect, constructeur, installatie) (5 mnd) VO	**Collegebesluit**	**May-17**	**Nov-17**
8. Ontwerpfase (10 mnd) VO	**Collegebesluit**	**Oct-17**	**Sep-18**
Van voorlopig tot definitief ontwerp Inclusief omgevingsvergunning			
9. Aanbesteding (5 mnd) VO	**Collegebesluit**	**Jun-18**	**Nov-18**
Voorselectie, aanbesteding + gunning			
10. Realisatie (15 mnd) VO		**Nov-18**	**Mar-20**
Van uitvoering tot oplevering, incl werkvoorbereiding			
11. Opstellen gebiedsvisie De Haven		**Dec-16**	**Jul-17**
3.1 Inventarisatie		Dec-16	Feb-17
3.2 Opstellen concept-visie met secenario's		Feb-17	Mar-17
3.3 Vaststellen concept-visie door b en w	**Collegebesluit**		Apr-17
3.4 Inspraak op concept-visie			May-17
3.5 Verwerken inspraak		May-17	Jun-17
3.6 Vaststellen visie door b en w	**Collegebesluit**		Jun-17
3.7 Vaststellen visie door gemeenteraad	**Raadsbesluit**		Jul-17
12. Bestemmingsplanprocedure VO	**Raadsbesluit**	**Jun-17**	**Sep-18**
